Amabwiriza y'umubaji: imbere muri sitidiyo

Buri ntambwe yo gutunganya imbere muri sitidiyo, mu gishushanyo kiriho ibipimo byacyo, muri milimetero.


> ***Ubusobanuro:*** *iyi nyandiko yahinduwe na mudasobwa (machine draft). Igomba gusuzumwa n'umuntu uvuga Ikinyarwanda kavukire mbere yo kuyiha abakozi. Iyo hari itandukaniro, kurikiza iy'Icyongereza.*

Status: verisiyo A2, 2026-10-28, PRELIMINARY. Banza upime (intambwe ya 1): atelier ntigira icyo ikata mbere ya verisiyo B.

Sitidiyo zombi zirasa, bityo aya mabwiriza akora kuri zombi.

English: read this guide in English · Gucapa: aya mabwiriza nka PDF

1. Pima kontineri (Umunsi wa 1)

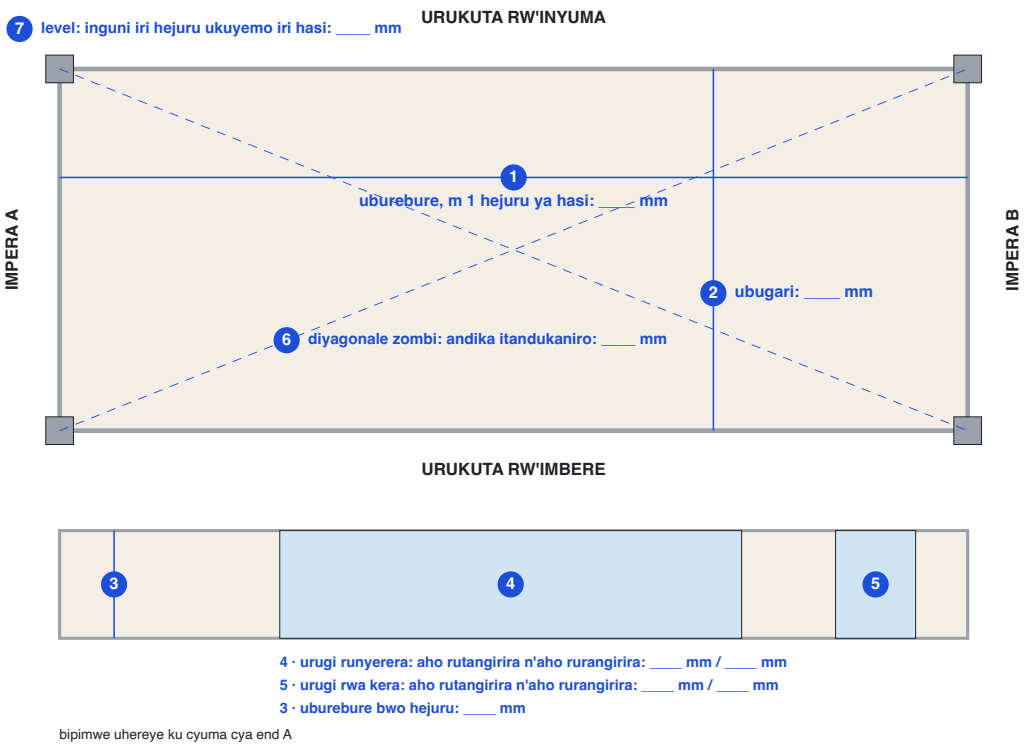


Umunsi wa 1: pima imibare 7 uyandike ku rupapuro · open full size

1. Pima kontineri zombi za sitidiyo; uzandikeho U1 na U2 ku nzugi ukoresheje ingwa (chalk).

2. Andika imibare 7, wohereze ifoto y'urupapuro uwo munsi.

2. Icyumba kirangiye

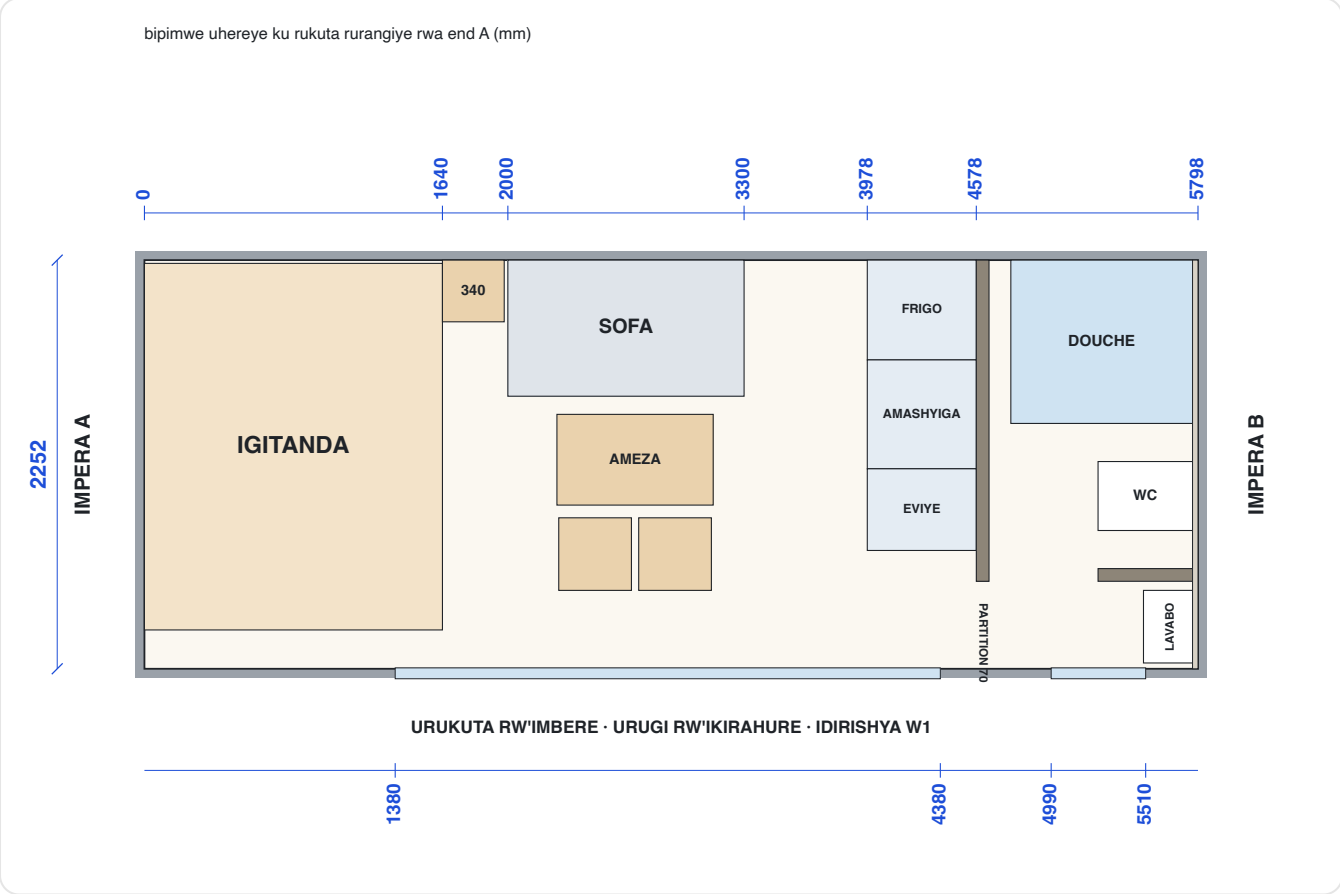


Icyumba urebye uri hejuru: buri murongo upimwe uhereye ku rukuta rurangiye rwa end A · open full size

- Icyumba kirangiye gifite uburebure 5798, ubugari 2252 n'uburebure bwo hejuru 2316.
- End A ni impera ifunze, iruhande rw'igitanda; end B ni impera y'ubwiherero.


3. Ibishyirwa ku cyuma

URUKUTA: icyuma → icyumba




= 50

HASI: hejuru ya hasi ha kontineri 28 (hatewe umuti)



= + 17

IGISENGE: icyuma cy'igisenge → icyumba




= 60

uburebure bw'icyumba: 2393 – 17 – 60 = 2316

Ibice: urukuta 50, hasi 17, igisenge 60 · open full size

4. Hasi: membrane n'impapuro (S02)

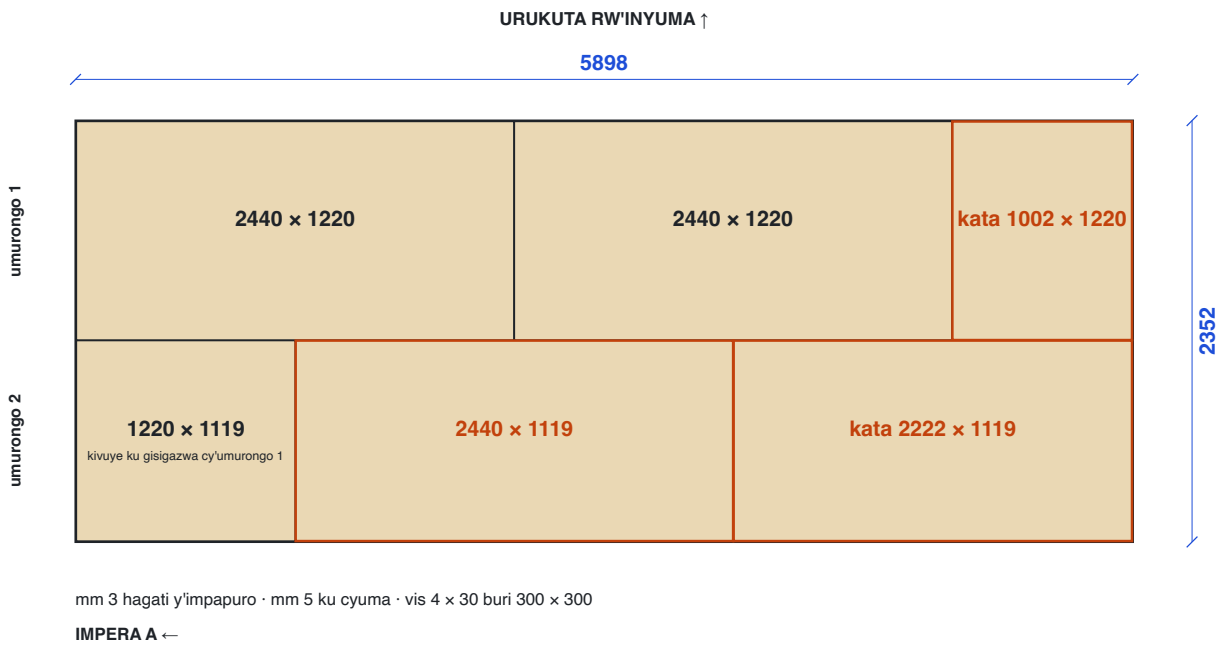


Hasi: impapuro 5, izikatwa ziri mu ibara ritukura · open full size

1. Banza urangize gusudira kose (S01): nta gusudira iyo foam imaze gushyirwamo.
2. Shyiraho membrane hejuru ya hasi ha kera, laps mm 150. Ntuzigere ukuba (sand) hasi ha kera.
3. Shyiraho impapuro nk'uko bigaragara mu gishushanyo uzifunge: vis 4 × 30 buri mm 300.


5. Ibiti (battens) (S03)



Urukuta rw'inyuma: hagati ya buri giti, bipimwe uhereye ku cyuma cya end A · open full size



End A, urukuta rw'imbere n'ibiti biri hejuru y'urugi runyerera · open full size

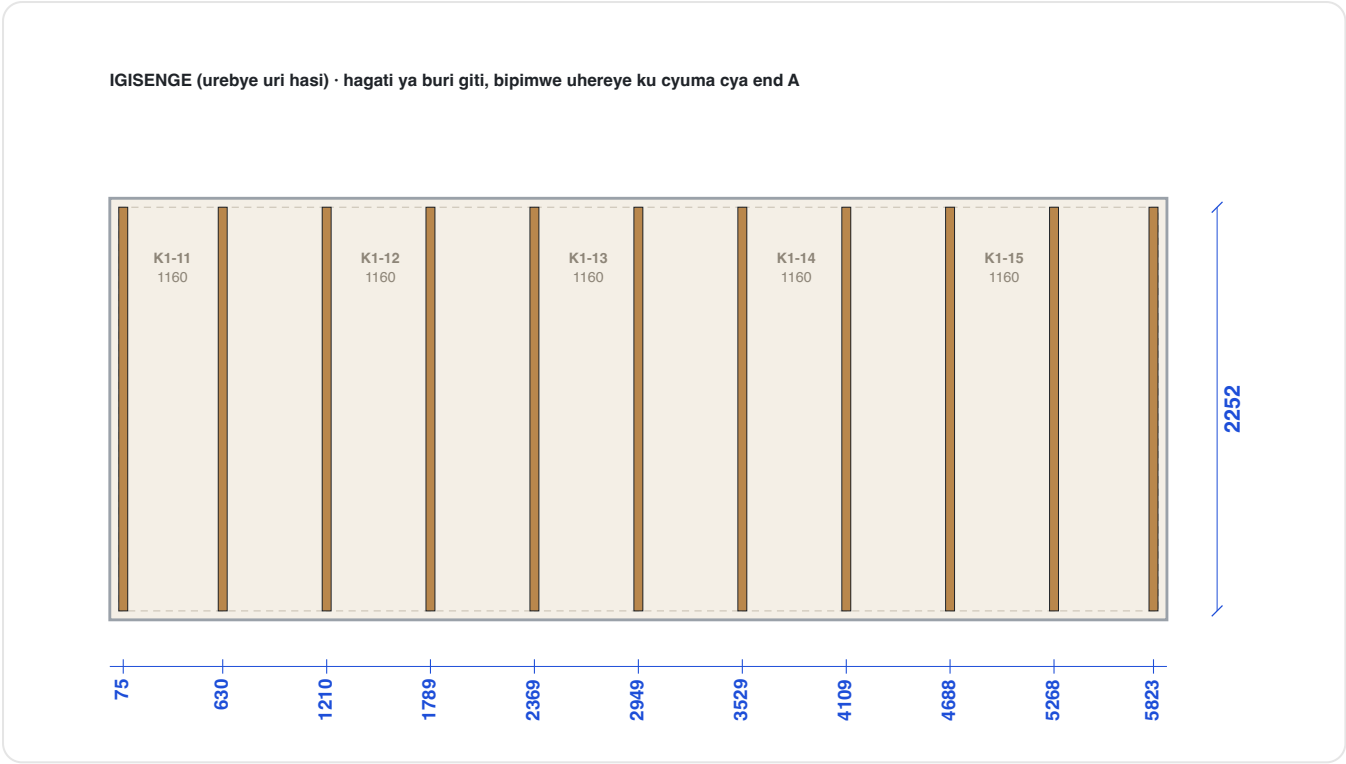


Igisenge: hagati ya buri giti, bipimwe uhereye ku cyuma cya end A · open full size

1. Ibiti 38 × 50, bihagaze ku mpapuro za hasi.
2. Shyira akamenyetso hagati ya buri giti uhereye ku cyuma, ku mibare iri mu gishushanyo.
3. Vis zifite amababa 5.5 × 50 ku mpera zombi na buri mm 600.

6. Amatiyo n'insinga, hanyuma foam (S04, S05)

1. Umuyagankuba (electrician) n'umufundi w'amazi (plumber) bashyiramo insinga n'amatiyo (S04).
2. Amatiyo ageragezwa kuri bar 10: tegereza urupapuro rwasinywe.
3. Foam ishyirwa hagati y'ibiti; tegereza amasaha 24, hanyuma uyikate ingane n'ibiti.

7. Impapuro za lining (S05)

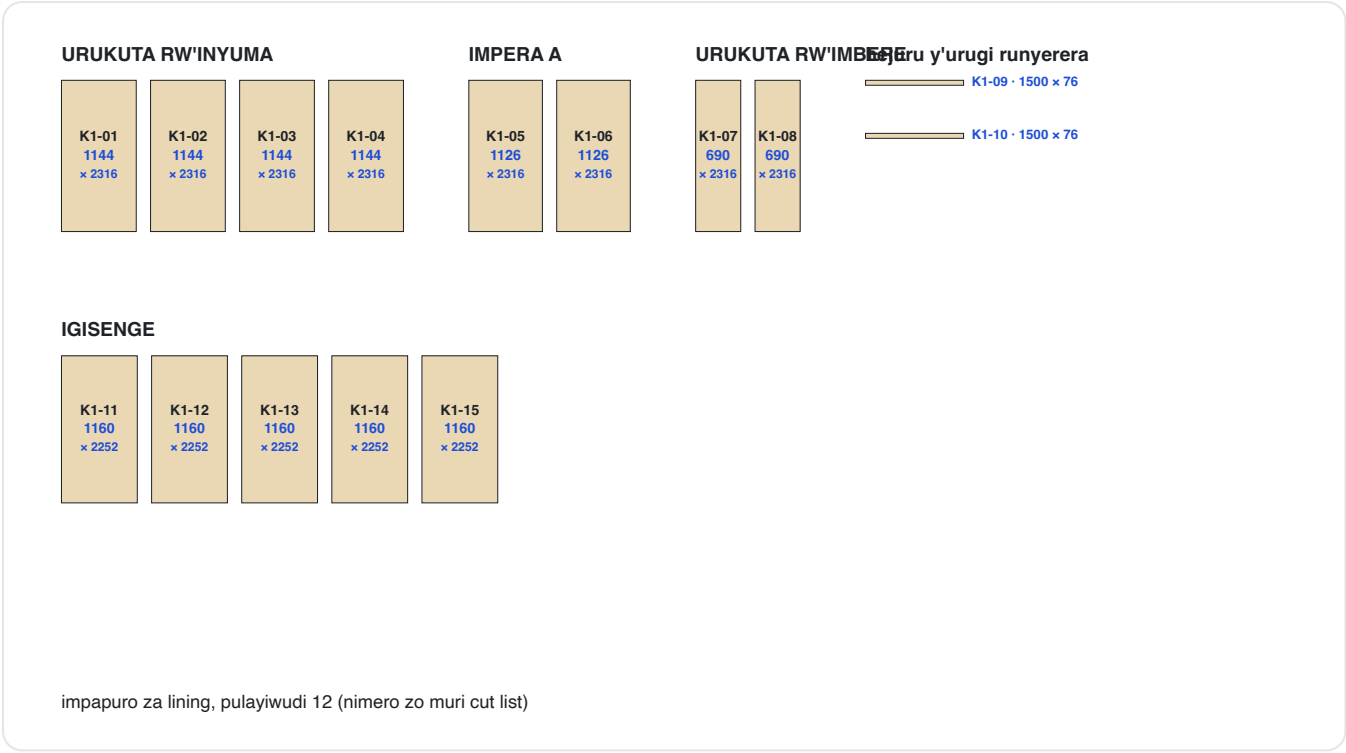


impapuro za lining, pulayiwudi 12 (nimero zo muri cut list)

Impapuro 15 za lining n'ingano zazo · open full size

1. Banza igisenge, hanyuma inkuta.
2. Buri ruhande rw'urupapuro rugwa hagati ku giti.
3. Vis 4 × 30: buri mm 200 ku mpande, buri mm 300 hagati.

8. Ubwiherero (S06 kugeza S10)

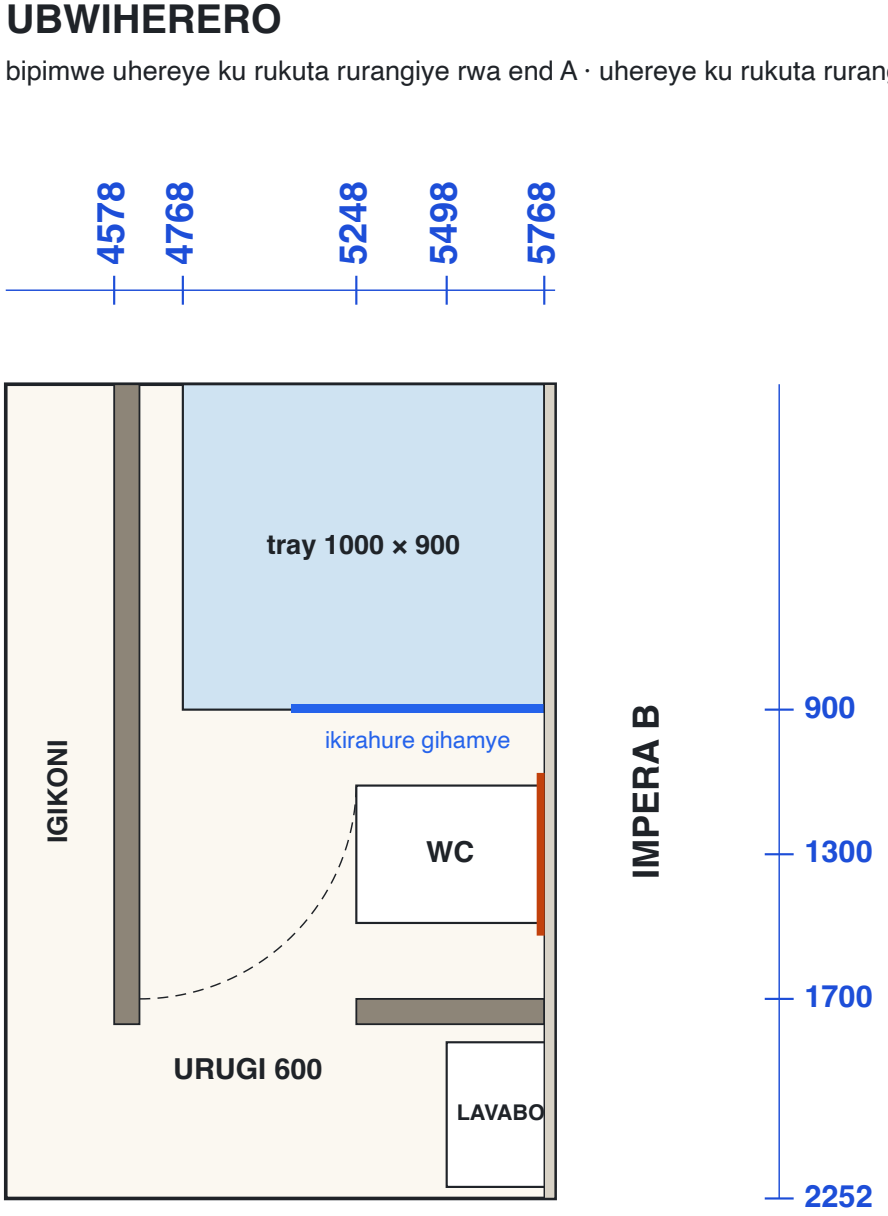


heater ya L 30 hejuru ya WC: 450 × 450 × 300

WC: 520 × 380 · LAVABO: 300 × 400 · ikirahure gihamye: 700

Ubwiherero urebye uri hejuru, n'ingano zose · open full size

9. Igikoni (S11 kugeza S14)

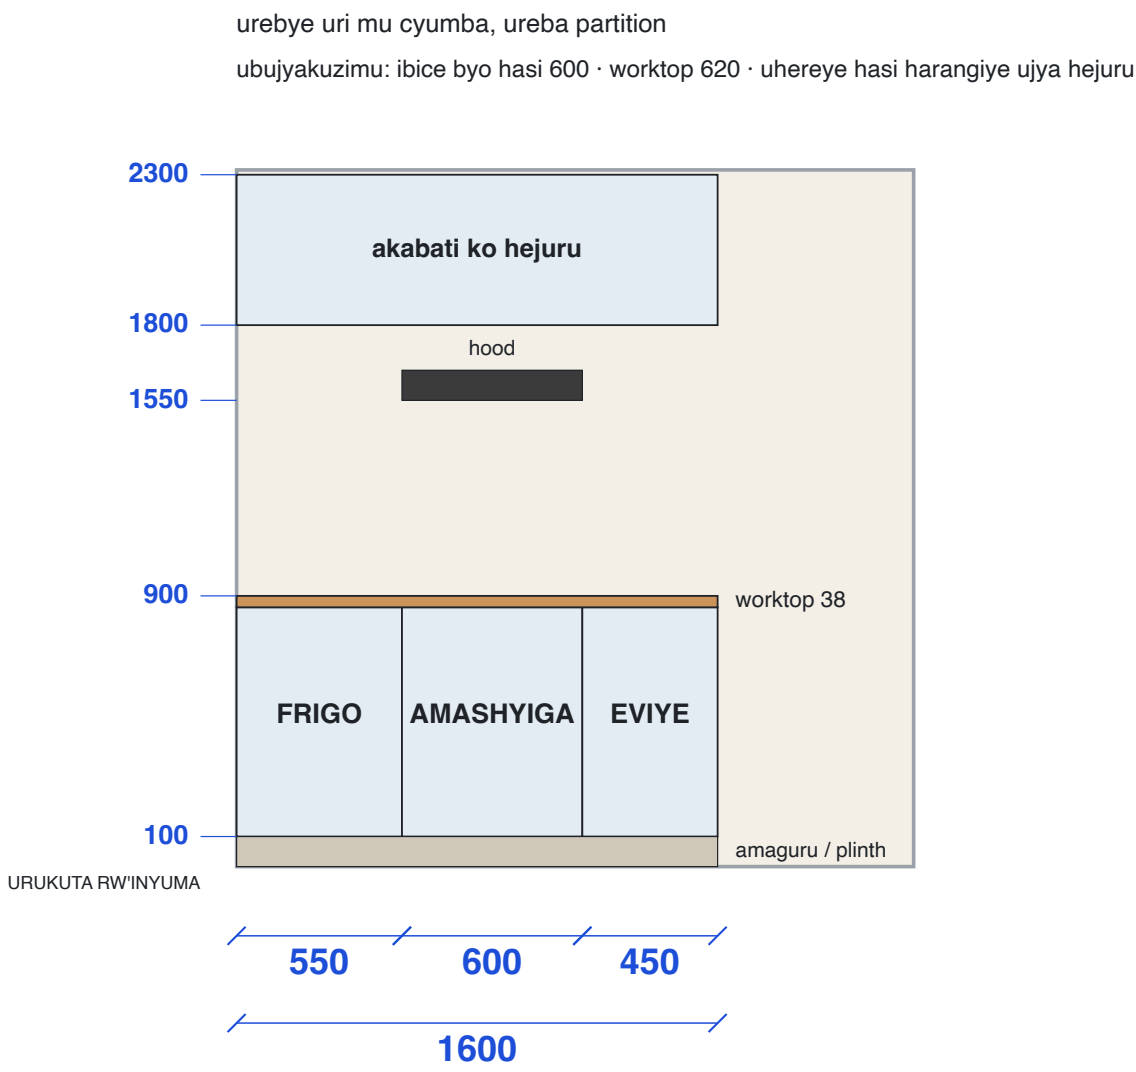

Igikoni urebye uri mu cyumba · open full size

1. Banza ushyireho imbaho z'igiti (oak planks), uhereye kuri end A kugeza kuri partition.
2. Hanyuma ibice bitatu byo hasi, worktop, akabati ko hejuru na hood.

10. Igitanda, intebe na trims (S15 kugeza S18)

- Igitanda, akameza ko ku buriri, ameza n'intebe na trims biva muri atelier nka kits zifite nimero: teranya buri kimwe ukurikije urupapuro rwa kit yacyo.

11. Hagarara ugenzure

1. Ibipimo byoherejwe → verisiyo B → atelier irakata.
2. Gusudira kose kwarangiye → hanyuma foam.

3. Igerageza ry'amatiyo ryatsinze → hanyuma foam.
4. Foam imaze amasaha 24 yuma → hanyuma impapuro.
5. Membrane y'ubwiherero yagenzuwe → hanyuma amakaro.

12. Ibyo kugura, kuri sitidiyo

Ikintu	Umubare
Pulayiwudi 12, impapuro 2440 × 1220, hasi	5
Pulayiwudi 12, impapuro 2440 × 1220, lining	15
Pulayiwudi 18, impapuro 2440 × 1220	8
Pulayiwudi itinjiza amazi (marine) 18, impapuro 2440 × 1220 (ubwiherero)	3
Worktop 38, 3050 × 650	1
Ibiti byatewe umuti 38 × 50, uburebure m 2.4	32, wongereho 10%
Isashi ya membrane 250 µm	15.3 m²
Imbaho z'igiti (oak planks) 5 zifite underlay	11.1 m²
Spray foam, ishyirwaho n'umuhanga wayo	34.9 m²
Vis zifite amababa 5.5 × 50	192
Vis z'igiti 4 × 30, hasi na lining	189 + 600
Ibitereko bya beto (block stands) 40 × 60 cm	4

Urutonde rwuzuye n'ibiciro ni bill of materials; ingano ya buri gice iri muri cut list.

13. Ibibazo bigomba gusubizwa mbere y'intambwe ivugwa

1. Ni izihe kontineri ebyiri ziba U1 na U2? Umunsi wa 1.
2. Hari umusuderi wateganyijwe? Mbere ya S01.
3. Ni nde uzashyiraho spray foam? Mbere ya S05.
4. Impapuro za hasi mm 12, cyangwa mm 18 niba hasi ha kera hatarangana birenze mm 5 kuri m 2? Mbere ya S02.
